


**Regione Autonoma Valle d'Aosta
Comune di Rhemes-Notre-Dame**

Committente

DEVAL SPA a.s.u.

Oggetto

**Costruzione impianto elettrico MT/BT per allacciamento cabina elettrica
denominata "Artalle" in Comune di Rhemes-Notre-Dame**

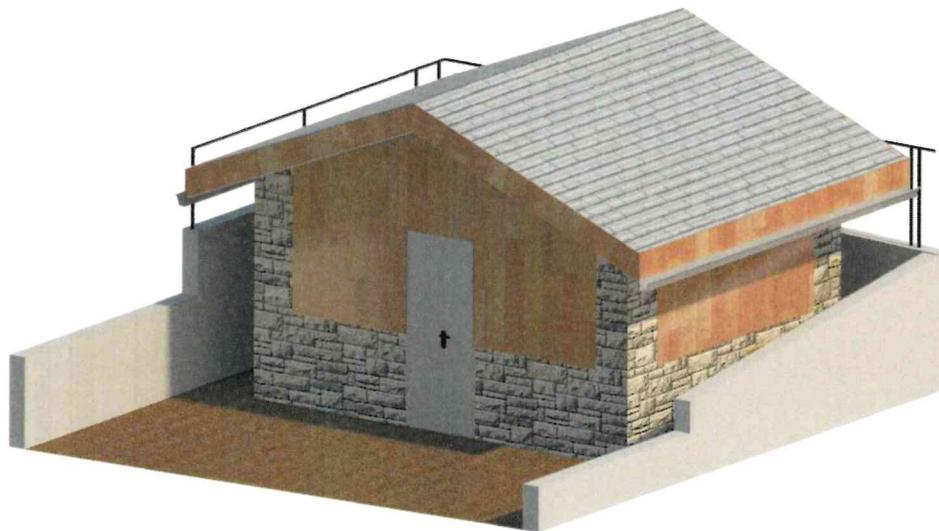

Bilancio inerti e materiali di risulta

Il tecnico
(ing. Manuel Lavoyer)

DEVAL S.p.A. a.s.u.
Presidente e AD
Giorgio Pession

Ing. Manuel Lavoyer - n. A 595 - Fraz. Banchet 38, 11024 PONTEY (AO)
Tel 380-3095143 - email "m.lavoyer@gmail.com"

Firmato digitalmente da
Manuel Lavoyer

Data e ora della firma:
26/05/2019 18:20:12

DATI DEL CANTIERE IN CUI SI PRODUCONO I MATERIALI/RIFIUTI

COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME		LOC. ARTALLE
DATI CATASTALI	foglio n. 4 part. 171 (cabina) foglio n. 3-4 mappali vari (linea)	
OGGETTO DEL PROGETTO	posa cavi elettrici sotterranei MT/BT per allacciamento nuova cabina elettrica denominata "Artalle" in località Artalle (cabina) e località Brenand - Carré	
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA CUI DERIVANO LA PRODUZIONE DI MATERIALI E/O DI RIFIUTI:		
attività:	SCAVI per cabina e posa tubazioni interrate	
attività:		
attività:		
PROGETTISTA	ing. LAVOYER MANUEL	
COMMITTENTE DELL'OPERA	DEVAL S.p.A. a s.u.	

SEZIONE GESTIONE RIFIUTI

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ MAX PRODOTTA TON/MC
miscele bituminose costr. Stradale	170302	132

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ AVVIATA AL RECUPERO ton/mc	IMPIANTO RECUPERO	QUANTITÀ AVVIATA ALLO SMALTIMENTO ton/mc	IMPIANTO DI SMALTIMENTO	estremi autorizzazione impianto recupero/smaltimento
miscele bituminose	170302	132	CAVE CHAVONNE s.r.l. Loc. Preille 28, 11010 Saint-Pierre			

SEZIONE GESTIONE SOTTOPRODOTTI

elenco delle tipologie di sottoprodotti	quantità previste ton	tipologie di riutilizzo individuata e specificare in quale cantiere/attività
legno non trattato		
pietre/lose		
serramenti riutilizzabili		
terra e rocce da scavo	69(cabina)+780(linea)	Riutilizzo nello stesso cantiere di produzione
altre tipologie da specificare:		

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUANDO CLASSIFICATI COME SOTTOPRODOTTI

	MC
quantità TOTALE prodotta	69(cabina)+780(linea)
quantità riutilizzata direttamente in cantiere	69(cabina)+780(linea)
quantità avviata a riutilizzo in altro cantiere	
quantità avviata a recupero presso impianti	

Terreno riutilizzato per sistemazione e livellamento terreno limitrofo alla cabina
 Terreno riutilizzato per riempimento trincea dopo posa tubazione interrata
